

國立中興大學改善無障礙校園環境  
民國 105 年改善計畫(專案 2)

成果報告

指導單位：教育部

承辦單位：國立中興大學

中華民國 109 年 11 月 17 日

# 國立中興大學

## 執行教育部 105 年度補助改善無障礙校園環境(專案 2)

### 成果報告

一、 依據：

(一)教育部 106 年 12 月 15 日臺教學(四)字第 1060183562 號函。

(二)教育部 107 年 2 月 6 日臺教學(四)字第 1070020313 號函。

(三)教育部 109 年 10 月 7 日臺教學(四)字第 1090142490 號函。

二、 目的：改善校園無障礙電梯及通路，活動較頻繁之公共建築物空間之室內、室外、水平及垂直移動均能連貫串聯，使行動不便者可輕鬆自由出入不受限制，以利其充分使用學校資源。

三、 指導單位：教育部。

四、 主辦單位：國立中興大學。

五、 補助項目：無障通路改善、無障礙電梯設備。

六、 核定補助經費：補助新台幣 175 萬元(原合約金額 4,400,000 元，變更後合約金額 4,668,120 元)。

七、 經費來源：教育部補助 37.67%(1,750,000 元)，本校自籌 62.33%(2,895,517 元，變更追加費用由本校自籌)。合計總結算提報 464 萬 5,517 元。

八、 執行情形：

(一) 工程名稱：國立中興大學「105 年度校園無障礙環境改善工程(專案 2)-學生活動中心無障礙電梯設備工程」。

(二) 改善地點：學生活動中心大樓(圓廳 1 處無障礙電梯設備)。

(三) 開工日期：108 年 5 月 13 日(工期 300 日曆天，惟因申請雜項執照需辦理地質鑽探及遭遇不明管線障礙排除原因，於 108 年 12 月 9 日核准展延不計工期 168 日曆天)。

(四) 完工日期：109 年 8 月 17 日。

(五) 驗收日期：109 年 10 月 5 日。

九、 預計改善項目與實際改善項目差異部分說明：

學生活動中心(圓廳)原無電梯設備，擬改善增設學生活動中心(圓廳)無障礙電梯設備 1 座，完成後可以使行動不便者可輕鬆自由出入不受限制，以利其充分使用學校資源。

十、 工程勘驗紀錄：

(一) 驗收紀錄：(詳附件)

(二) 驗收照片：



圖 1. 電梯使用驗收情況


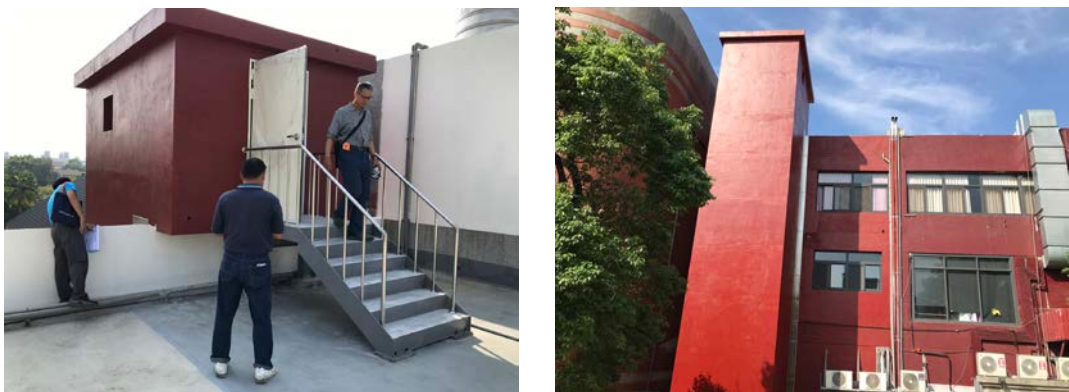


圖 2. 電梯機房及外觀勘驗

十一、改善照片及效益說明：

(一) 改善位置示意圖：

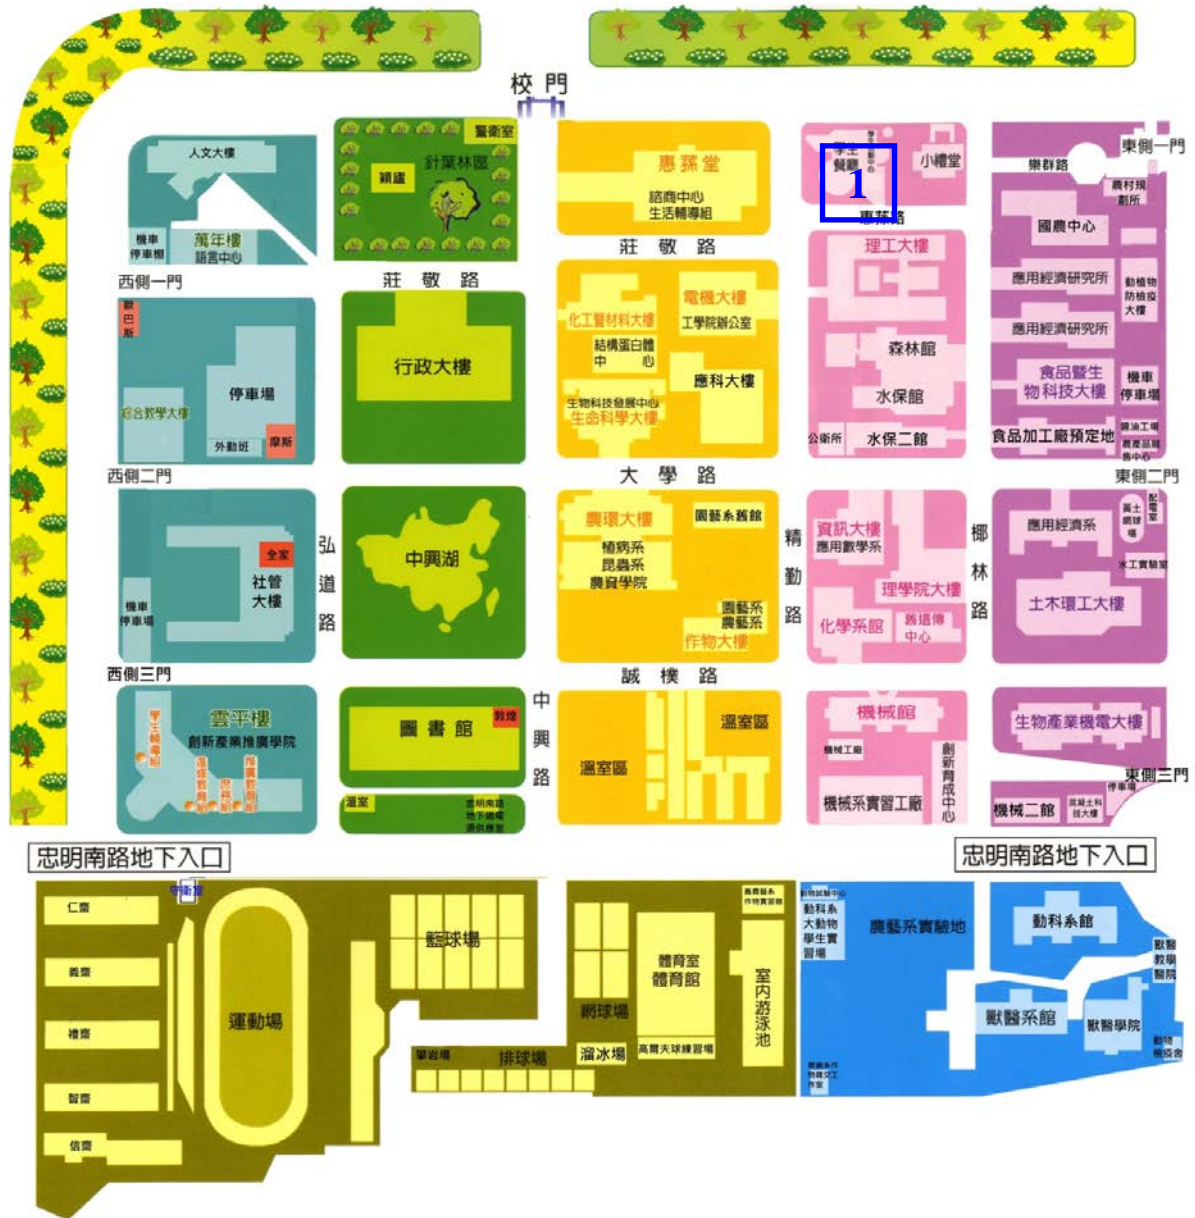

(二) 改善效益說明：

改善建物	學生活動中心(圓廳)無障礙電梯設備 1 部	改善項目	無障礙電梯增設
改善前照片		改善前狀況說明	學生活動中心(圓廳)現場原無電梯。
		改善方法	增設無障礙電梯 1 部。
改善後照片		改善效益	增設無障礙電梯 1 部完成後可以使行動不便者可輕鬆自由出入不受限制,以利其充分使用學校資源。
		使用經費	約新台幣 465 萬元。
