

國立中興大學

104 年無障礙校園環境改善工程

成果報告

中華民國 105 年 12 月 19 日

1050402610

1


國立中興大學

執行教育部 104 年度補助改善無障礙校園環境成果報告

- 一、依據：教育部 105 年 1 月 4 日臺教學(四)字第 1040185424 號函辦理。
- 二、目的：改善校園無障礙通路及斜坡道，活動較頻繁之公共建築物空間之室內、室外、水平及垂直移動均能連貫串聯，使行動不便者可輕鬆自由出入不受限制，尤其增設綜合教學大樓 13 樓國際會議室升降設備，設置驗收完成後學生立即配合上課使用，達到充分使用學校資源之目的。
- 三、指導單位：教育部。
- 四、主辦單位：國立中興大學。
- 五、補助項目：無障通路改善、無障礙坡道改善、綜合教學大樓 13 樓國際會議室升降設備。
- 六、核定補助經費：新台幣 59 萬 8,880 元整。
- 七、經費來源：教育部補助 41 萬 9,216 元(70%)，本校自籌 17 萬 9,664 元(30%)。
- 八、執行情形：
 - (一)工程名稱：國立中興大學 104 年無障礙校園環境改善工程。
 - (二)改善地點：水保大樓、理學大樓、綜合教學大樓 13 樓國際會議室。
 - (三)開工日期：105 年 1 月 4 日。
 - (四)驗收日期：105 年 4 月 26 日。
- 九、預計改善項目與實際改善項目差異部分說明：

綜合教學大樓 13 樓國際會議室增設升降設備改善工程，惟使用單位反映該處升降設備與既有平台有高低差，故於國際會議室新增木製平台。
- 十、工程勘驗紀錄：請詳附件。
 - (一)驗收紀錄 1 份、驗收照片 1 份。
- 十一、改善照片及效益說明：

(一)改善位置示意圖

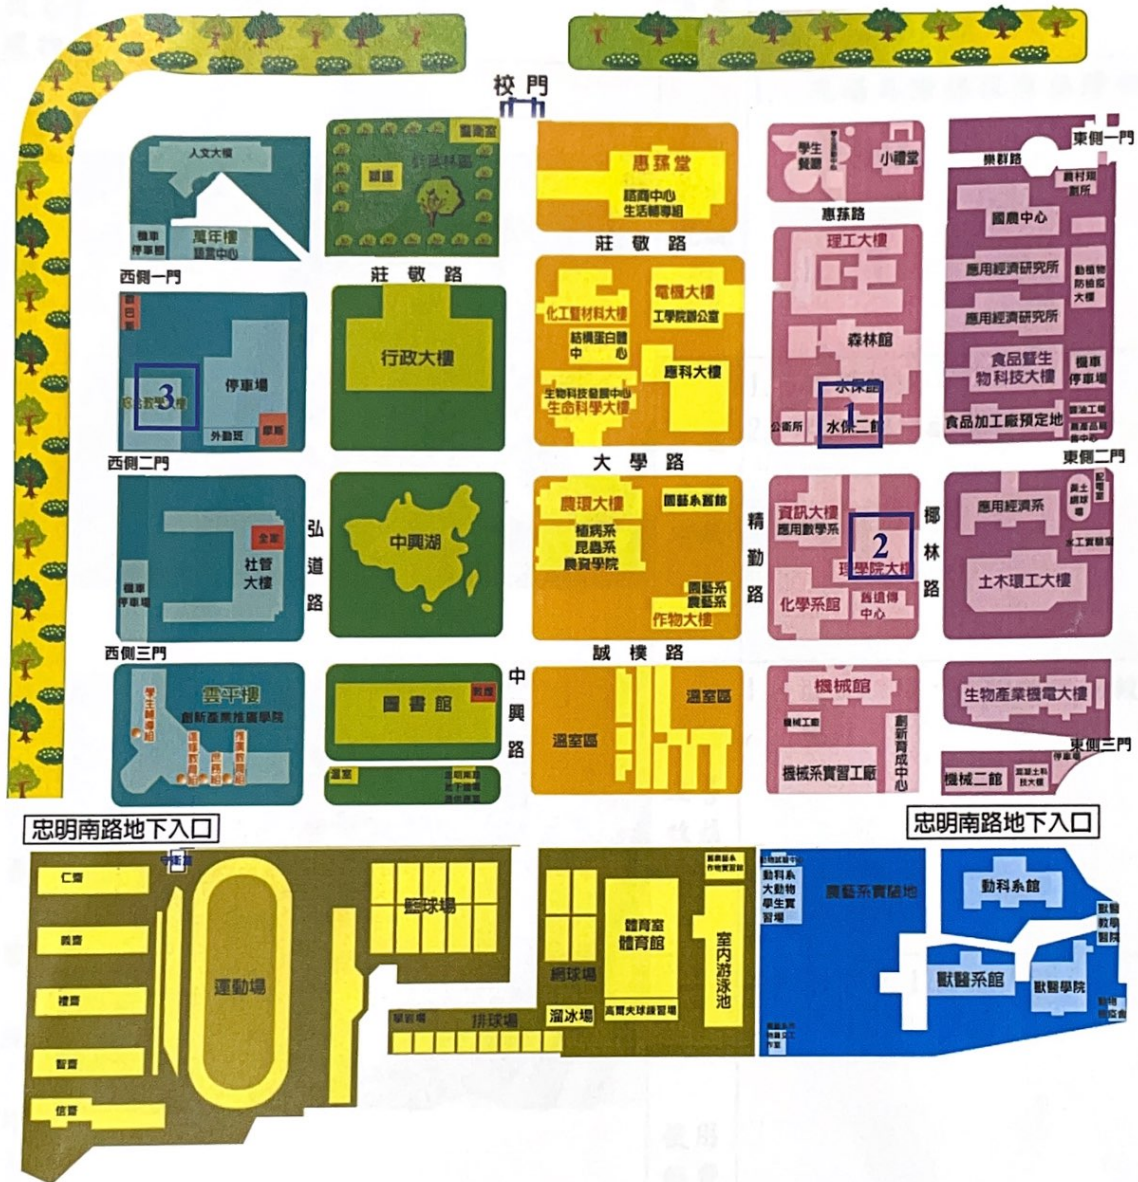

(二) 改善效益說明

改善建物	一、水保館	改善項目	無障礙坡道改善
改善前照片		改善前狀況說明	1. 現場為階梯沒有無障礙坡道。
		改善方法	1. 階梯拆除。 2. 增設無障礙坡道。
改善後照片		改善效益	1. 坡道拉緩，使輪椅推動較不費力。
		使用經費	約新台幣 2.1 萬元。

改善建物	二、理學大樓	改善項目	通道改善
改善前照片		改善前狀況說明	1. 現有無障礙尺寸不符規定。 2. 現有磁磚剝落。
		改善方法	1. 修改無障礙廁所相關位置及尺寸。 2. 改善通道入口位置。 3. 增設指示標誌。
改善後照片		改善效益	1. 通道入口平順，使行動不便者通行輕鬆無壓力。 2. 無障礙廁所衛生設備重新施作，使用無壓力。
		使用經費	約新台幣 6.8 萬元。

改善建物	三、綜合教學大樓 13 樓國際會議室		改善項目	通道改善
改善前照片		改善前狀況說明	1. 現有觀眾席沒有無障礙升降設備及坡道。 2. 入口有高低差。	
			改善方法	1. 增設無障礙升降設備。
改善後照片		改善效益	1. 使行動不便者能無障礙的至觀眾席。	
			使用經費	約新台幣 22.1 萬元。
